



Comune di Torre Annunziata Città Metropolitana di Napoli

"Rimozione e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti presenti nell'area demaniale del comune di Torre Annunziata (Na) sul lungomare Oplonti in località "Salera", nell'ambito "degli interventi di riqualificazione ambientale, risanamento e rifunzionalizzazione dell'area Salera"

Relazioni

Elaborato:

RI

Titolo elaborato:

Gestione delle interferenze

RTP

MANDANTE

Ing Pasquale De Luca



MANDATARI

Ing Tommaso Pelella

Arch. Anna Improta



Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Codice doc.	Nome file
00	1 emissione		Ing. Pasquale De Luca	Ing. Tommaso Pelella	Ing. Tommaso Pelella	RI_08	RI_08 Gestione delle interferenze

Sommario

1. Premessa 2

2. Descrizione sintetica del progetto..... 2

3. Individuazione e censimento delle interferenze 2

4. Gestione delle attività interferenti 3

Codice elaborato	Elaborato	pagina
RI_8	Relazione gestione delle interferenze	1

1. Premessa

La presente relazione è parte integrante del progetto “Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto di torre annunciata ed aree limitrofe – completamento attività di risanamento ambientale località Salera in area demaniale”.

Le attività oggetto del presente progetto esecutivo consistono rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti abbancati nell’area pubblica località Salera ubicata nel Comune di Torre Annunziata.

Il progetto prevede l’adozione di soluzioni tecniche ed organizzative allo scopo di ridurre al minimo le interferenze individuate.

Il presente documento è parte integrante del progetto e illustra nel dettaglio le metodologie e gli accorgimenti adottati per la gestione delle interferenze che si determinano in ragione delle lavorazioni che si effettuano sul litorale.

Il presente documento descrive le procedure organizzative e le soluzioni tecniche che si intendono adottare per evitare interruzioni delle normali attività dell’officina durante le lavorazioni e per eliminare i rischi derivanti dalle attività interferenti.

2. Descrizione sintetica del progetto

Il progetto consiste rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti abbancati nell’area pubblica località Salera ubicata nel Comune di Torre Annunziata.

Le attività in progetto consistono in:

- approntamento del cantiere
- smantellamento cumulo:
 - smantellamento cumulo A
 - smantellamento cumulo B
 - smantellamento cumulo C
 - smantellamento cumulo D
 - smantellamento cumulo E
 - smantellamento cumulo F
 - smantellamento cumulo G
- Trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti vagliati separati

3. Individuazione e censimento delle interferenze

Le lavorazioni consistono nella bonifica delle aree invase dai rifiuti a ridosso nella nuova bretella di collegamento nell’area portuale e spiaggia denominata Salera.

Considerando il contesto in cui si inserisce l’attività di bonifica, le interferenze sono:

- vicinanza del cantiere alla strada pubblica: la movimentazione del materiale da smaltire potrebbe causare la diffusione di polveri
- viabilità interna al cantiere: il cantiere è ubicato sulla spiaggia Salera, quindi un contesto naturale
- viabilità esterna: si prevede il transito di mezzi in ingresso e uscita dal cantiere per il trasporto e conferimento dei rifiuti presso le discariche.


Codice elaborato	Elaborato	pagina
RI_8	Relazione gestione delle interferenze	2

4. Gestione delle attività interferenti

La corretta gestione delle fasi lavorative consente di minimizzare le interferenze, di cui al paragrafo precedente, con le attività presenti con conseguente riduzione dei rischi sia per i lavoratori che effettuano le attività oggetto del presente progetto sia per l'ambiente circostante.

Le procedure per la gestione della sicurezza, ai fini dell'eliminazione delle interferenze evidenziate in precedenza, prevedono l'adozione delle seguenti soluzioni progettuali:

- Utilizzo di pannellature cieche per la recinzione dell'intera area di cantiere che confina con la strada pubblica e lato mare
- Utilizzo di teli di protezione sotto le strade di cantiere interne per preservare l'area dal passaggio dei mezzi di cantiere. Inoltre saranno posizionati teli impermeabili anche sotto l'area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti precedentemente separati e classificati
- Utilizzo di un sistema di lavaruote per i camion in uscita dal cantiere
- Utilizzo di un sistema di monitoraggio ambientale, qualità dell'aria, al fine di controllare in maniera costante l'area di lavoro e intervenire tempestivamente nel caso di riscontro anomalie.

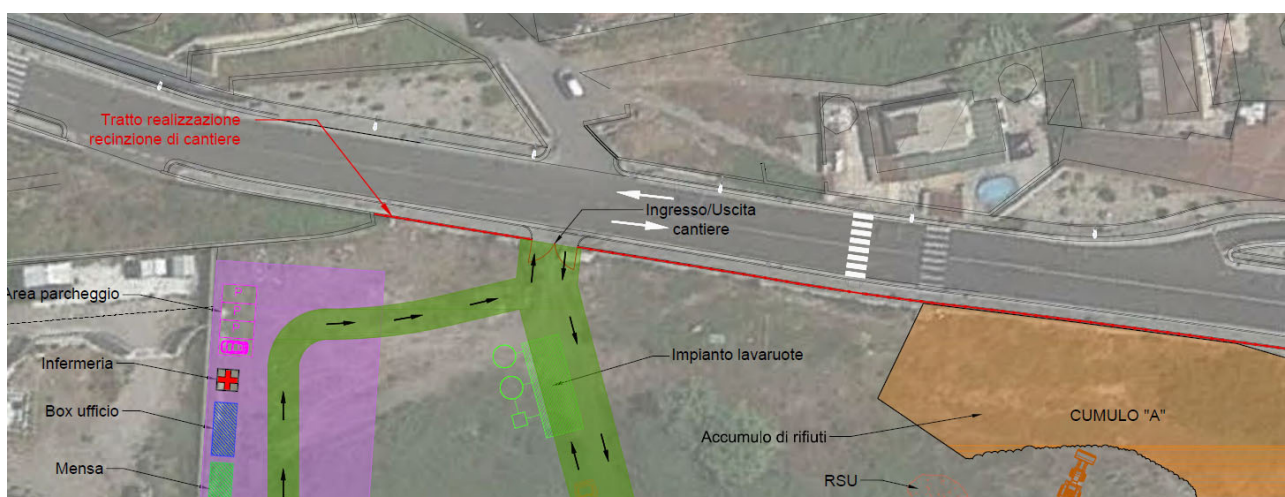

Codice elaborato	Elaborato	pagina
RI_8	Relazione gestione delle interferenze	3
